

Projet Sainte-Catherine Ouest

Avancement des travaux

12 juillet 2021

Montréal 




Travaux d'aménagement

Rue Sainte-Catherine Ouest entre Mansfield et Robert-Bourassa



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Mai 2021 à novembre 2021

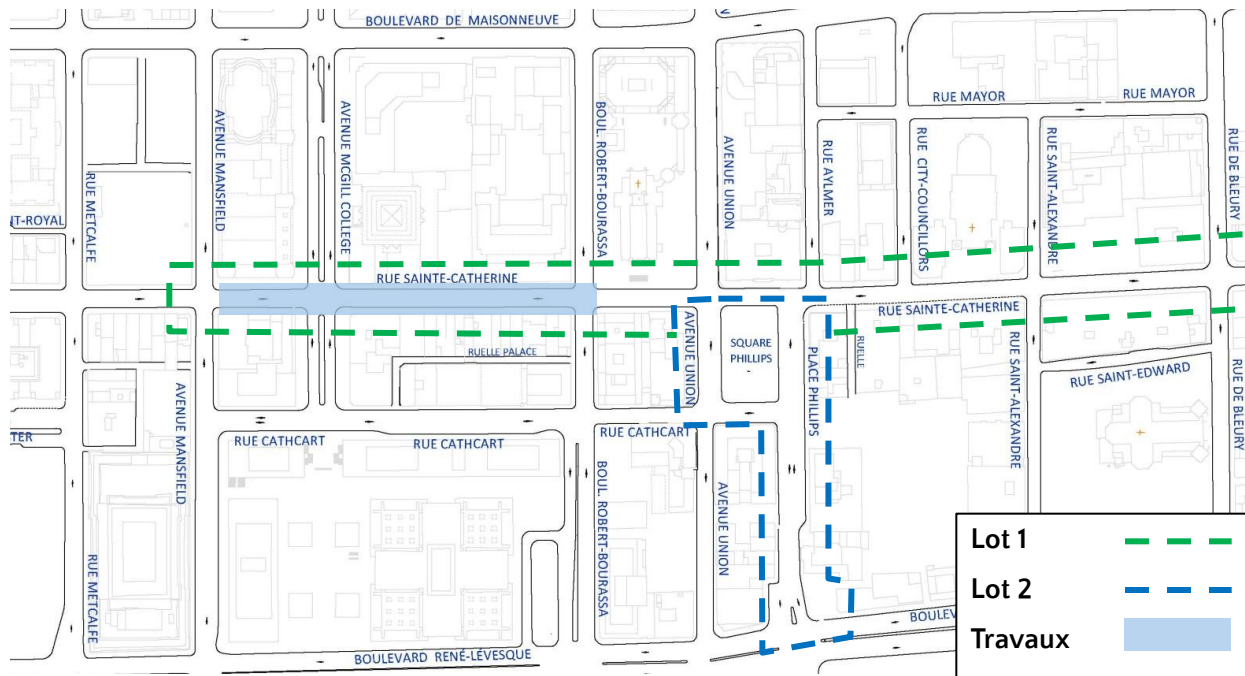

Aménagement Lot 1B

- Trottoirs et chaussée en pavés de béton
- Caniveaux de drainage dans la chaussée
- Fosses d'arbres et plantation
- Conduits électriques
- Mobilier urbain distinctif
- Éclairage public
- Feux de circulation
- Wifi

Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Avancement des travaux

Travaux intersection Robert-Bourassa

Chaussée

- Ajustement des utilités publiques : **à venir**
- Dalle de béton : **à venir**
- Pose des pavés : **à venir**

Trottoirs

- Réfection de la portion Sud-Ouest pour ragréage de niveau : **à venir**

Travaux à venir : Septembre

Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Avancement des travaux

Travaux Robert-Bourassa à McGill College

Chaussée

Pose des conduites de drainage pour caniveaux : **100%**

Excavation pour les bordures de granite : **100 %**

Pose des bordures de granit : **100 %**

Installation des caniveaux : **10 %**

Bétonnage dalle de béton : **à venir**

Trottoirs

Préparation des fosses d'arbres : **100 %**

Préparation de trottoir et armatures : **100 %**

Bétonnage dalle de béton : **70 %**

Plantation : **À venir à l'automne**

Mobilier urbain et éclairage : **À venir à l'automne**



Préparation fosses d'arbres (aération)



Bassin captation pour caniveau drainage

Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Avancement des travaux

Travaux Robert-Bourassa à McGill College



Préparation pour pose de bordure



Mise en place des bordures de granite



Bordure de granite et fosses d'arbres



Caniveaux de drainage préfabriqué


Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Avancement des travaux

Travaux Robert-Bourassa à McGill College



Préparation pour bétonnage dalle

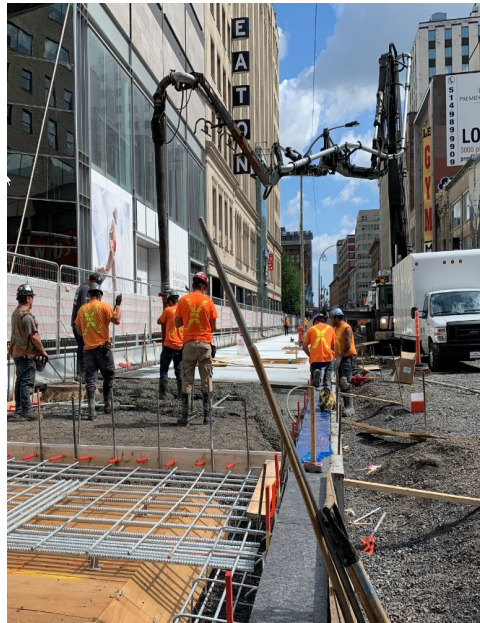

Bétonnage dalles trottoirs



Trottoirs bétonnés



Trottoirs bétonnés

Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Avancement des travaux

Travaux intersection McGill College

Chaussée (coins S-O, N-O, N-E)

Réparation des cours d'eau dans le rayon S-O : **100%**

Réparation des cours d'eau dans le rayon N-O : **100%**

Réparation des cours d'eau dans le rayon N-E : **100%**

Trottoirs (coins S-O, N-O)

Installation des bases et conduits d'éclairage N-E : **100%**

Préparation pour bétonnage N-E : **100%**

Bétonnage N-E : **100%**

Installation des bases et conduits d'éclairage S-O : **100%**


Préparation pour bétonnage S-O : **100%**

Bétonnage S-O : **100%**

Installation des bases et conduits d'éclairage N-O : **100%**

Préparation pour bétonnage N-O : **100%**

Bétonnage N-O : **100%**

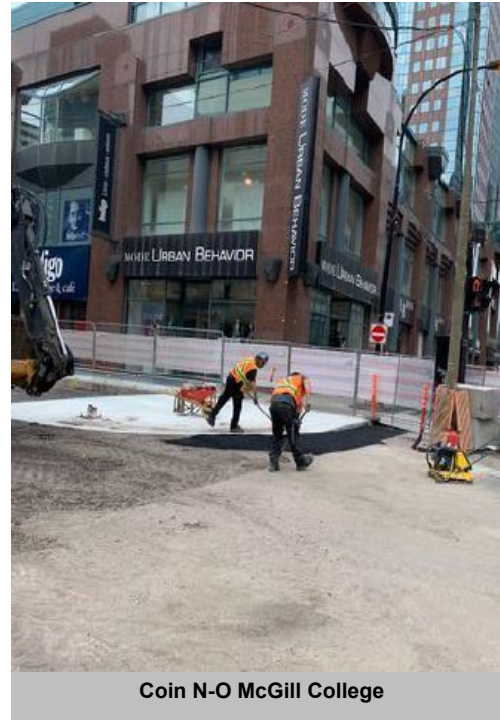

Coin N-O McGill College



Coin S-O McGill College

Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Avancement des travaux

Travaux McGill College à Mansfield

Chaussée

Pose des conduites de drainage pour caniveaux : 100 %

Excavation pour les bordures de granite : 40 %

Pose des bordures de granit : **à venir**

Installation des caniveaux : **à venir**

Bétonnage dalle de béton : **à venir**

Trottoirs

Bases de lampadaires et conduits d'éclairages: 100 %

Déplacement des bornes incendies : 100 %

Préparation des fosses d'arbres : 100 %

Préparation de trottoir et armatures : **à venir**

Bétonnage dalle de béton : **à venir**

Plantation : **À venir à l'automne**

Mobilier urbain et éclairage : **À venir à l'automne**



Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Avancement des travaux

Travaux intersection Mansfield

Chaussée (coins S-E, N-E, S-O., N-O)

Réparation des cours d'eau dans le rayon S-E : **à venir**

Réparation des cours d'eau dans le rayon N-E : **à venir**

Réparation des cours d'eau dans le rayon S-O : **à venir**

Réparation des cours d'eau dans le rayon N-O : **à venir**

Trottoirs (coins S-E, N-E, S-O., N-O)

S-E et N-E : **à venir**

Installation des bases et conduits d'éclairage S-O : **100%**

Préparation pour bétonnage S-O : **80%**

Bétonnage S-O : **à venir**

Installation des bases et conduits d'éclairage N-O : **100%**

Préparation pour bétonnage N-O : **80%**

Bétonnage N-O : **à venir**



Coin S-O Mansfield



Coin N-O Mansfield

Rue Sainte-Catherine O. entre Mansfield et Robert-Bourassa

Horaire de travail

Horaire de travail - variable selon la progression des travaux


- De 7 h à 16h 30 du lundi au vendredi
- Dépassement de l'horaire lors de coulée de béton (début des travaux à 5 h du matin)
- Ajout d'un quart de travail le samedi si nécessaire
- Advenant tout retard dans l'échéancier possibilité de travaux 24h/24 et 7 jours sur 7

Travaux d'aménagement

Square Phillips et l'avenue Union



Square Phillips et l'avenue Union Janvier 2021 à juin 2021

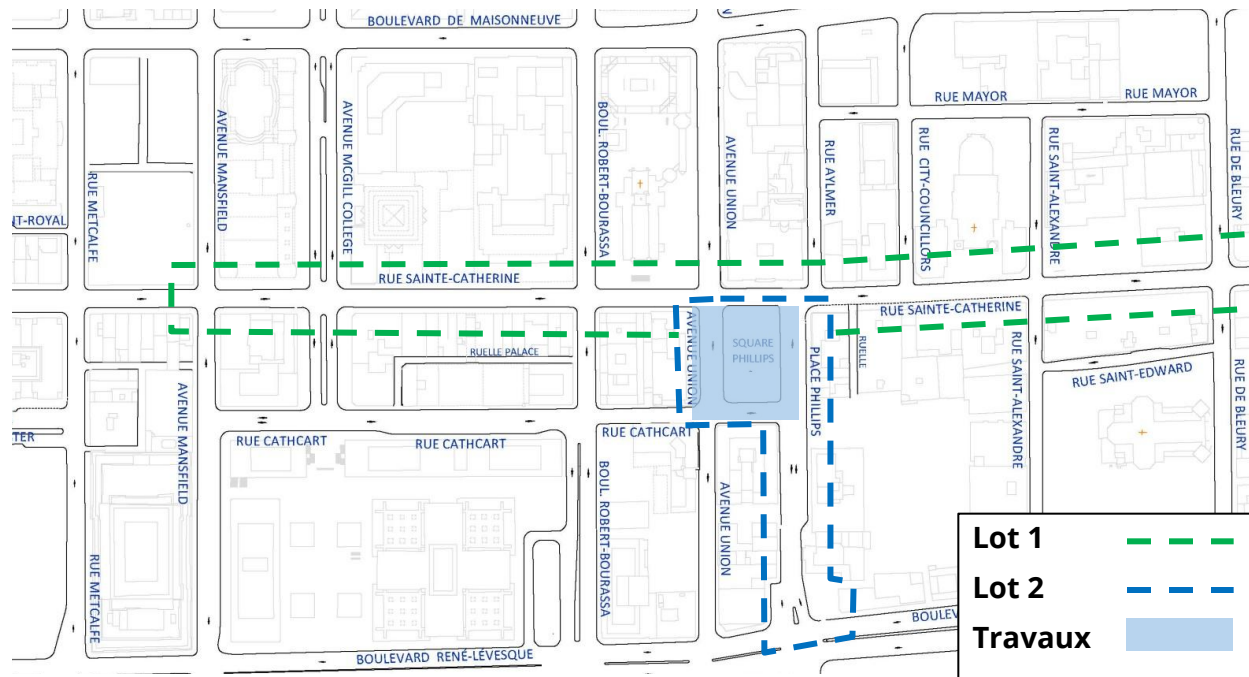

Lot 2D

- Aménagement de surface Square Phillips
- Restauration du monument
- Interventions archéologique
- Parterre d'eau
- Aqueduc sur avenue Union
- Caniveaux de drainage dans la chaussée sur Union
- Fosses d'arbres et plantation
- Conduits électriques
- Mobilier urbain distinctif
- Éclairage public
- Wifi

Square Phillips et l'avenue Union

Présentation du projet

Réaménagement


- Travaux : octobre 2020 à été 2022

Portée des travaux

- Aménagement de surface du square Phillips
- Aménagement d'un parterre d'eau
- Restauration des monuments
- Interventions archéologiques
- Travaux d'aqueducs sur l'avenue Union
- Chaussée et trottoirs en pavés de béton sur Union
- Réhabilitation du réseau gazier
- Travaux sur le réseau électrique

Avancement des travaux

- Infrastructures : 98% complétés
- Aménagement de surface : 10% complétés

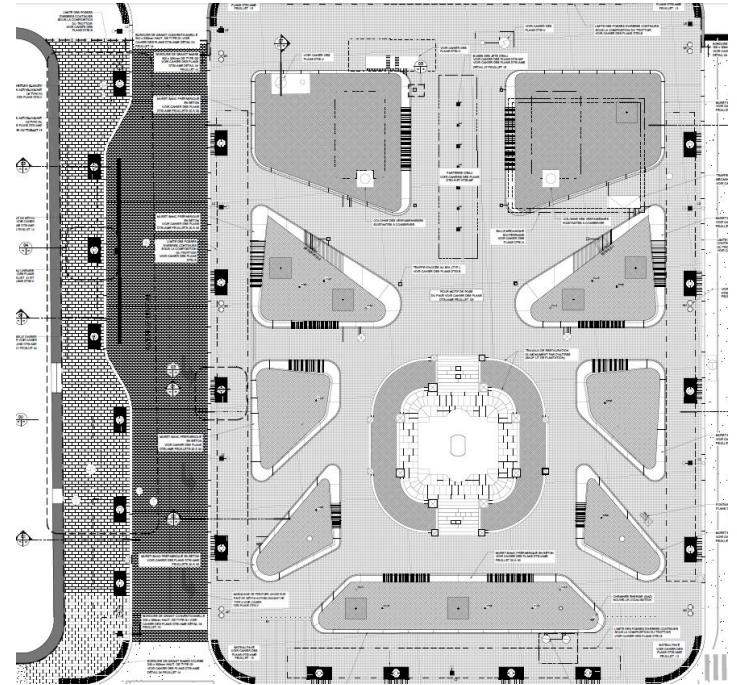

Avancement des travaux

Travaux sur les infrastructures souterraines

- Aqueduc: 100% complété
- Égout: 98% complété (caniveaux de drainage)
- Électriques: 95% complété (conduits d'éclairage square Phillips)
- Réhabilitation réseau gazier: 100% complété

Travaux d'aménagement de surface

- Trottoirs et chaussée rue Cathcart: 100% complétés
- Trottoirs avenue Union: 25% complétés
- Square Phillips: 5% (travaux préparatifs)

Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux

Travaux d'aménagement de surface



Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux


Travaux d'aménagement de surface (rue Cathcart)



Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux

- Salle mécanique (structure complétée à 100%)

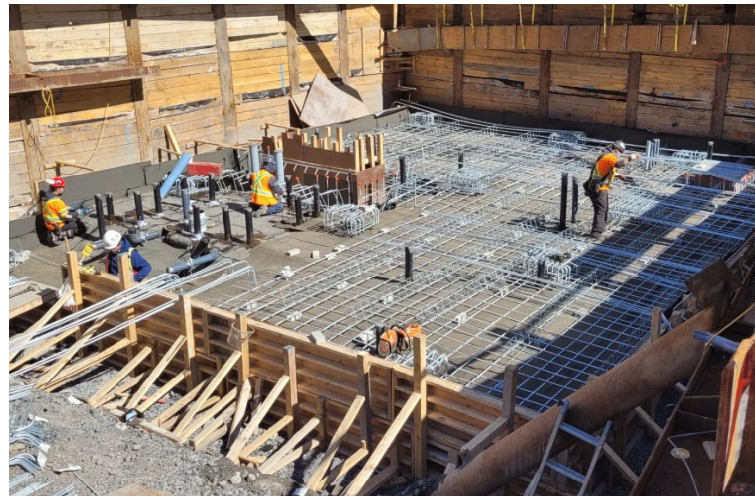

Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux

- Salle mécanique (structure à 100%)



Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux

- Salle mécanique (structure à 100%)



Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux

- Salle mécanique (structure à 100%)




Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux

- **Restauration des monuments**


- Nettoyage des bronzes en atelier – Remise en place automne 2021
- Réfection des fondations de béton et emmarchements – Mai 2021
- Restauration de la maçonnerie du parterre – Été 2021

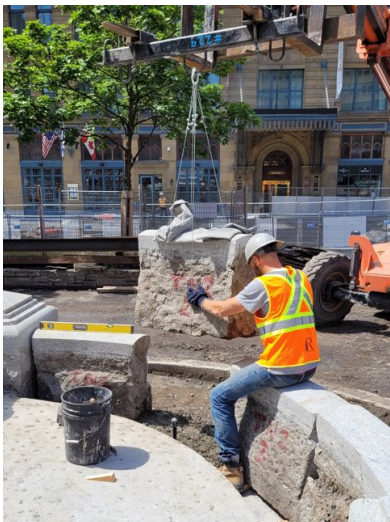

Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux


- Salle mécanique (maquette jets d'eau)

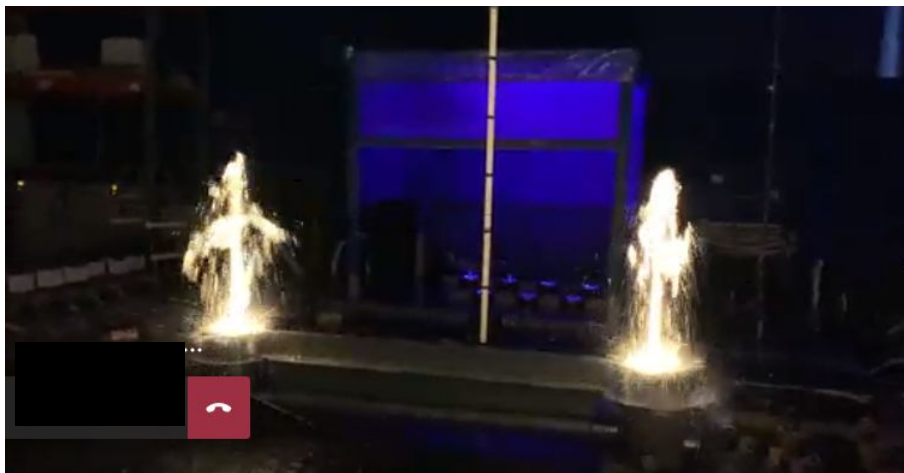

Square Phillips et l'avenue Union

Avancement des travaux

Aménagement muret-bancs (réception de l'échantillon)

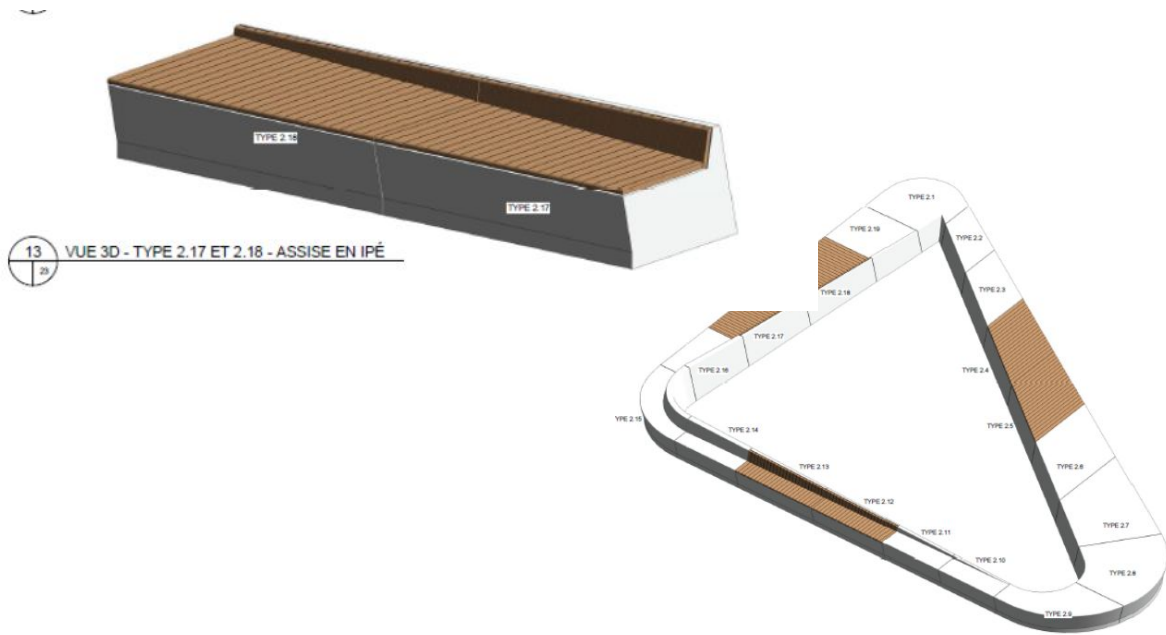

Square Phillips et l'avenue Union

Coupures d'eau de nuit

Coupures d'eau

- Aucune autre coupure d'eau prévue.

Square Phillips et l'avenue Union


Horaire de travail

Horaire de travail - variable selon la progression des travaux

- De 7 h à 16 h 30 du lundi au vendredi
- Dépassement de l'horaire lors de coulée de béton
- Ajout d'un quart de travail le samedi si nécessaire
- Advenant tout retard dans l'échéancier
- possibilité de travaux 24 h/24 et 7 jours sur 7

Chantiers Sainte-Catherine Ouest 2021

Échéancier

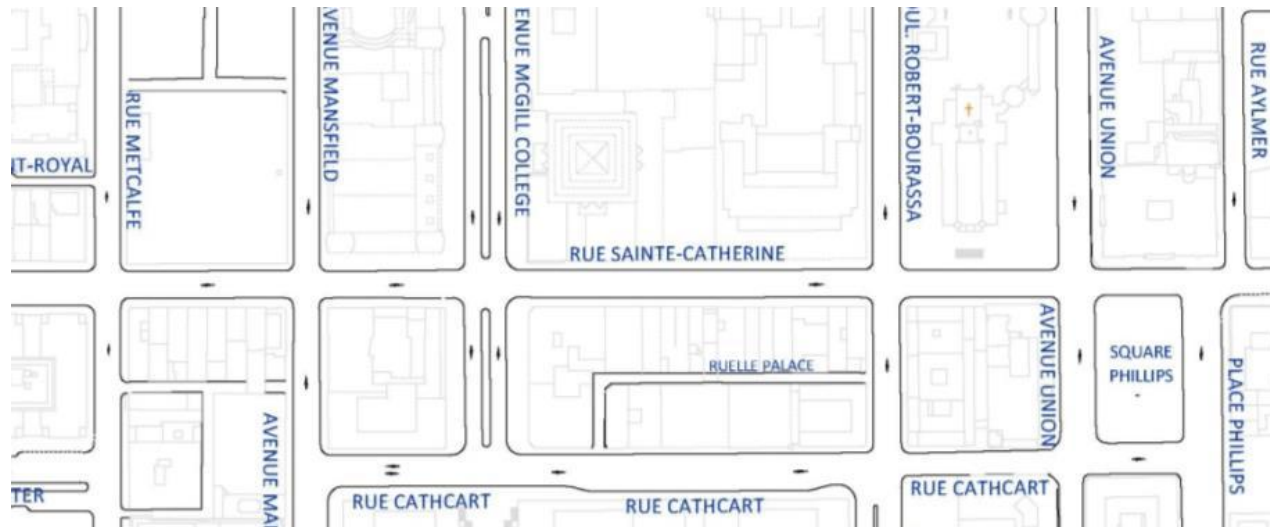


Intersection	Nature des travaux	Date début travaux	Date fin travaux
Intersection Mansfield	Aménagement	Mi-juin 2021	Début septembre 2021
Intersection McGill	Aménagement	Début mai 2021	Fin juin 2021
Intersection Robert-Bourassa	Aménagement	Début septembre 2021	Fin septembre 2021
Intersection Union/Cathcart	Aménagement	Décembre 2020	12 juillet 2021

Gestion des impacts et de la circulation

Gestion des impacts et de la circulation

Circulation

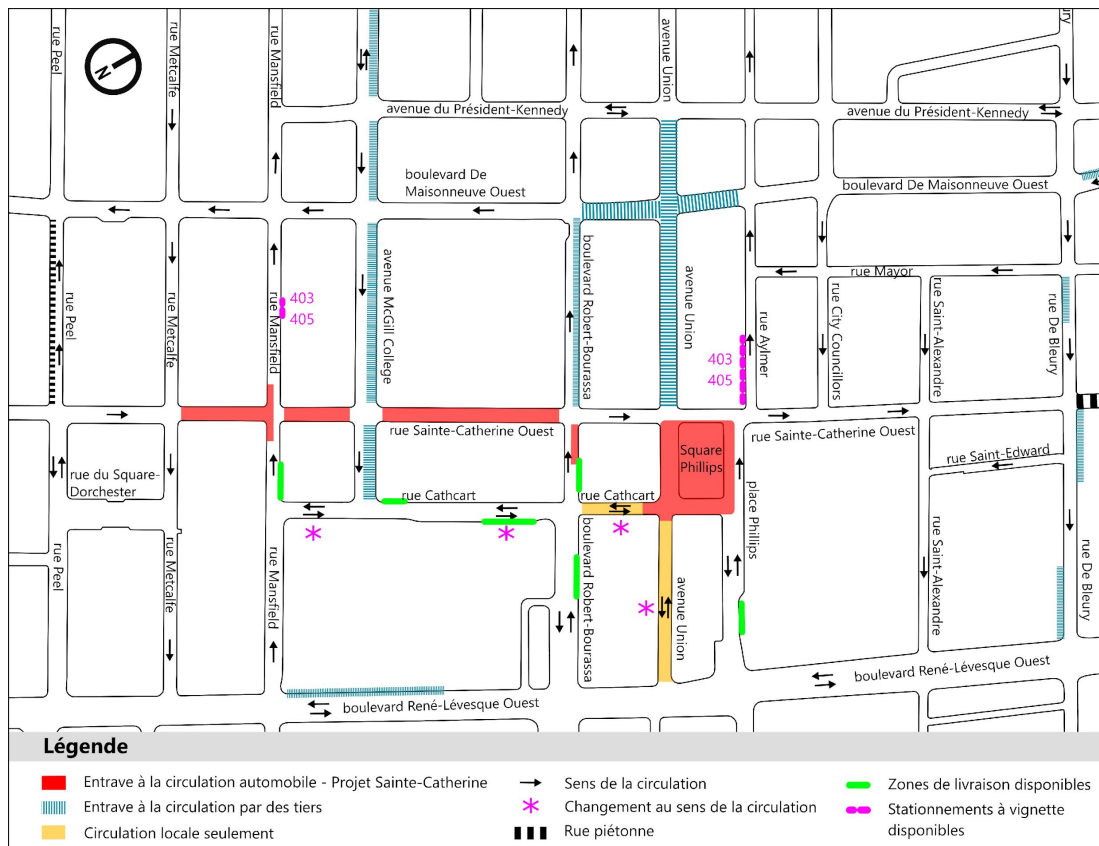


Accessibilité des automobilistes

- Circulation locale jusqu'à la limite des travaux
- Accès en tout temps aux véhicules d'urgences
- Présence de l'escouade mobilité, cadets, agents de stationnement
- Zones de livraison/taxi/stationnement : montreal.ca
- Gratuité du stationnement tarifé sur rue jusqu'au 6 septembre 2021 – les fins de semaine seulement

Gestion des impacts et de la circulation

Accessibilité des piétons


- Maintien des axes piétonniers
- Accès aux bâtiments et commerces
- Accessibilité universelle (rampes, passerelles)
- Signalétique et habillage de chantier

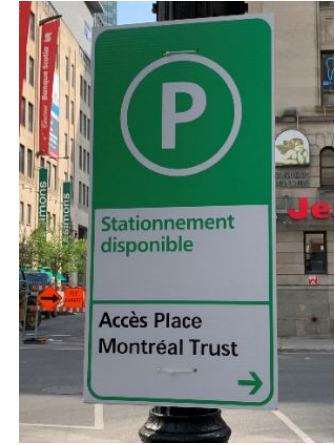

Gestion des impacts et de la circulation

Propreté du chantier

- Entretien des rues
- Nettoyage des vitres
- Maintien des collectes d'ordures et des matières recyclables

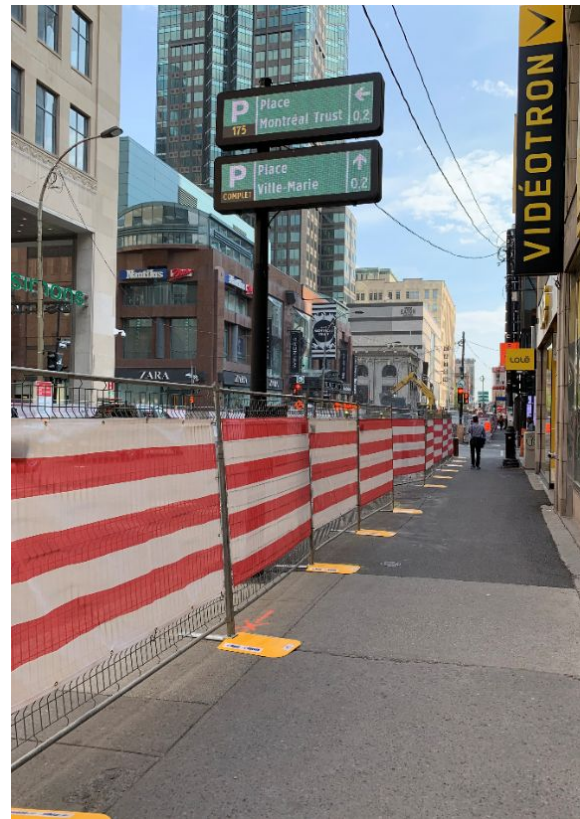

Gestion des impacts et de la circulation

Mesures de distanciation physique

- Signalétique de chantier
- Corridors piétons à double sens ou à sens unique
- Signalétique pour les files d'attente



Projet Sainte-Catherine Ouest

Restez informés !

Abonnez-vous !

[Avis et alertes](#)

[Avis de travaux électroniques / Avancement des travaux](#)
[Infolettre](#)

Agents de liaison

Judith Gendron

Théo Closson

Disponibilités: 7h30 à 18h Lundi au vendredi

@ [**SainteCatherineOuest@montreal.ca**](mailto:SainteCatherineOuest@montreal.ca)

514 867-9339

Information sur le projet : montreal.ca

[Carte à la circulation et des zones de livraison commerciales](#)

Montréal 
